

# JUNTA VIAL CANTONAL

Unidad Técnica de Gestión Vial  
Municipalidad de Bagaces



## Informe Anual de Rendición de Cuentas

2020

-Enero, 2021-

---

## I. DISPOSICIONES GENERALES

### I.1 Introducción

La Ley No. 9329 modificó el artículo 5 de la Ley N° 8114 y sus reformas. Mediante dicha modificación, se establece una redistribución del impuesto único a los combustibles, de tal forma que se destina un 15% adicional a los gobiernos locales del país. Según dicha disposición, de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles, un 22,25% se destinará a las municipalidades para la atención de la red vial cantonal, suma que les será girada de acuerdo con los siguientes parámetros: el cincuenta por ciento (50%), según la extensión de la red vial cantonal de cada cantón inventariada por los gobiernos locales y debidamente registrada en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT); el treinta y cinco por ciento (35%), según el Índice de Desarrollo Social (IDS) elaborado por el Ministerio de Planificación y Política Económica y el quince por ciento (15%) restante, será distribuido en partes iguales a cada una de las municipalidades. El inciso b) del artículo 5 de la Ley No. 8114 vigente, establece que la ejecución de los recursos dispuestos en esa norma se realizará bajo la modalidad participativa de ejecución de obras y que el destino de los recursos lo propondrá, a cada Concejo Municipal, una Junta Vial Cantonal o Distrital, en su caso, nombrada por el mismo Concejo, la cual estará integrada por representantes del gobierno local y de la comunidad, por medio de convocatoria pública y abierta, de conformidad con lo que determine el reglamento de dicha ley. *(La Gaceta, alcance 41, 23 de febrero del 2017)*

Como parte del factor de transparencia esta Junta Vial elabora el presente informe que contiene la ejecución de los proyectos viales del cantón de Bagaces, lo programado y lo ejecutado, así como las acciones ejecutadas con otros programas; de manera que sea de conocimiento tanto del Concejo Municipal como de la comunidad.

Este informe de carácter anual permite brindar una rendición de cuentas con información tanto financiera como técnica, de manera tal que se de conocer la inversión e impacto de cada una de las obras realizadas en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del cantón de Bagaces.

## I.2 Objetivos

### **Objetivo general:**

Brindar un informe en el cual se refleje la información de la ejecución de proyectos de impacto vial durante el año 2020, tanto los contemplados con los fondos de la Ley 8114/9329 incluyendo obras contratadas como obras por administración, como los llevados a cabo con fondos de otros programas.

### **Objetivos específicos:**

- Detallar los proyectos viales ejecutados por la Unidad Técnica de Gestión Vial durante el año 2020.
- Indicar el impacto y coordinaciones a nivel social logradas durante el año 2020 con las diferentes comunidades del cantón de Bagaces.
- Mostrar los proyectos ejecutados con fondos diferentes a los de la ley 8114.

## II. PLAN ANUAL DEL PRESUPUESTO LEY 8114/9329 AÑO 2020.

### II.1 PLAN ANUAL ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO. AÑO 2020

En este apartado se presentan los montos de los presupuestos ordinario y extraordinarios para el año 2020, así como el monto final recibido como parte de los fondos de la ley 8114/9329 para el ejercicio económico 2020. Además el detalle de los proyectos viales presupuestados y su ejecución.

Los presupuestos Ordinario 2020 ajustado y extraordinario 1-2020 contemplan tanto los proyectos Unidad Técnica (III-2-1) y Operativos (III-2-2), como los proyectos viales para cada uno de los distritos del cantón. Por su parte el Presupuesto extraordinario 3-2020 presupuesta los proyectos por el superávit 2019 y los compromisos presupuestarios no ejecutados al 30 de junio 2020.

Seguidamente se muestra en la tabla adjunta la estructura de los presupuestos de la ley 8114/9329 para la Municipalidad de Bagaces durante el año 2020.

**TABLA #1**  
**PRESUPUESTO MUNICIPALES LEY 8114/9329 AÑO 2020**

<b>PRESUPUESTOS ASIGNADOS. AÑO 2020.</b>	
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 AJUSTADO	<b>¢485.111.755.34</b>
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 1-2020 (diferencia por improbación de presupuesto ordinario)	<b>¢1.057.015.345.66</b>
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2020 (superávit 2019 y compromisos presupuestarios)	<b>¢90.804.355.05</b>

Las tablas a continuación muestran el monto total aprobado de los fondos de la ley 8114/9329 según Dictamen del Presupuesto Ordinario de la República para el ejercicio económico del año 2020, así como el monto final girado debido a rebajo por modificación Legislativa según Decreto Legislativo N°9879 publicado en la Gaceta N°186 del 29 de julio 2020. Al respecto, mediante acuerdo número #042 de Sesión Ordinaria 08-2020, la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Bagaces aplicó el rebajo mencionado a la parte de proyectos viales distritales.

El monto final asignado fue girado mediante 6 tractos durante el año 2020.

**TABLA #2**  
**REBAJO DE FONDOS ASIGNADOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020.**


MONTO INICIAL ASIGNADO 2020	¢1.542.127.101.00
MENOS RECURSOS NO RECIBIDOS POR REBAJO DECRETO LEGISLATIVO	¢314.845.413.00
TOTAL DE RECURSOS RECIBIDOS. AÑO 2020, LEY 8114/9329	¢1 227 281 688,00

**TABLA #3**  
**FECHAS DE DESEMBOLSOS. FONDOS 8114/9329 AÑO 2020**

TRACTO	FECHA DE DESEMBOLSO	MONTO DE DESEMBOLSO
I	10/3/2020	¢257,021,183.50
II	29/5/2020	¢228,090,571.84
III	24/8/2020	¢185,542,483.17
IV	22/9/2020	¢185,542,483.17
V	25/11/2020	¢185,542,483.17
VI	27/11/2020	¢185,542,482.99

En el gráfico adjunto se muestra el porcentaje del monto rebajado para el ejercicio económico del año 2020.

**GRAFICO #1**

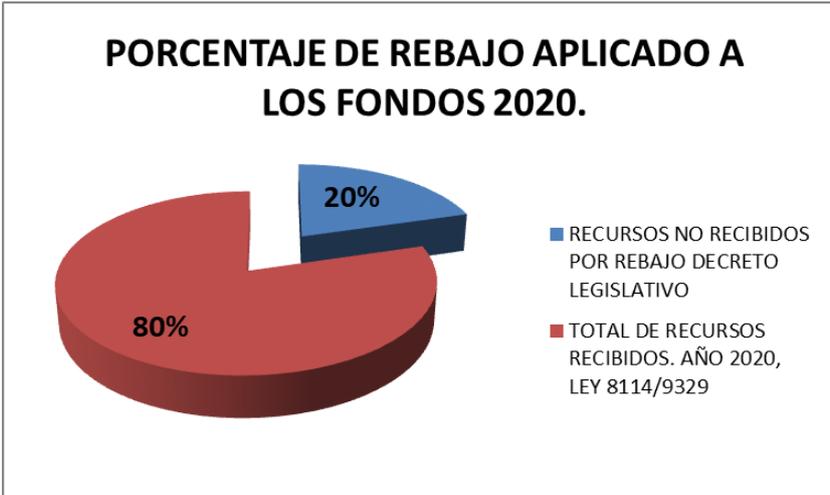

En la siguiente tabla se muestra el estado al 31 de diciembre 2020 de los proyectos a ejecutar con los fondos correspondientes al ejercicio económico 2020; después aplicado el rebajo en mención.

**TABLA #4**

**ESTADO DE PROYECTOS AL CIERRE DEL AÑO 2020**


**EJERCICIO ECONOMICO 2020. PROYECTOS VIALES. Ley 8114**

PROYECTOS A EJECUTAR DESPUES DE REBAJO POR DECRETO LEGISLATIVO			MONTO SEGÚN ADJUDICACION	AMPLIACION	MONTO CANCELADO	DOCUMENTO	ESTADO	SALDO EN COMPROMISO
CODIGO PRESUPUESTARIO	CODIGO CAMINO	BAGACES						
III-2-3	5-04-001	MEJORAMIENTO CAMINO MONTANO HACIA COFRADIA	€63 750 000,00	€4 824 722,00	€15 000 370,00	AUTORIZACION DE PAGO O.C.32662 CONCRETERA 001-2020 /FACT.4562	EN PROCESO DE EJECUCION	€53 574 352,00
III-2-4	5-04-020	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS BAGACES	€155 750 963,55	€0,00	€155 750 963,55	AUTORIZACION DE PAGO O.C.32625 MECO 001-2020/ FACT. 2921. AUTORIZACION DE PAGO O.C.32625 MECO 002-2020/ FACT. 3034	EJECUTADO	€0,00
III-2-5	5-04-026	MEJORAMIENTO CALLE EL SALTO	€28 744 926,00	€0,00	€28 744 926,00	AUTORIZACION DE PAGO O.C.32626 MECO 001-2020 / FACT. 2922	EJECUTADO	€0,00
III-2-6	5-04-015	MEJORAMIENTO CAMINO AGUA CALIENTE	€52 847 202,00	€11 999 981,52	€64 847 183,52	AUT. PAGO 001-2020 OC32649/ FACT. 726/. AUT. PAGO 002-2020 OC32649/ FACT. 737. AUTORIZACION DE PAGO O.C.32736 LABORO (AMPLIACION ) 001-2020/ FACT.762	EJECUTADO	€0,00
	<b>CODIGO</b>	<b>FORTUNA</b>						
III-2-7	5-04-003	MEJORAMIENTO CAMINO DE ENTRONQUE DE RUTA NACIONAL 165 HACIA SAN BERNARDO	€78 091 021,68	€0,00	€78 091 021,68	AUTORIZACION DE PAGO O.C.32650 MECO 001-2020/ FACT. 3154	EJECUTADO	€0,00
III-2-8	5-04-013	MEJORAMIENTO DE CAMINO CUIPILAPA - LA GIGANTA	€36 078 881,00	€0,00	€0,00	****	PENDIENTE	€36 078 881,00
	<b>CODIGO</b>	<b>GUAYABO</b>						

III-2-10	5-04-007	MEJORAMIENTO CAMINO PUEBLO NUEVO	€70 837 395,90	€0,00	€70 837 395,90	AUTORIZACION DE PAGO O.C.32664 MECO 001-2020/ FACT. 3153	EJECUTADO	€0,00
III-2-11	5-04-022	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CALLES URBANAS GUAYABO	€31 881 520,99	€0,00	€31 881 520,99	AUTORIZACION DE PAGO O.C.32652 MECO 001-2020 / FACT3219	EJECUTADO	€0,00
III-2-12	5-04-023 -5-04-025-5-04-036	MEJORAMIENTO CAMINOS LIMONAL - SAN ISIDRO	€35 799 200,00	€0,00	€0,00	****	PENDIENTE	€35 799 200,00
	<b>CODIGO</b>	<b>RIO NARANJO</b>						
III-2-15	5-04-044	MEJORAMIENTO EN CALLES SECTOR ESTE	€18 535 510,34	€0,00	€0,00	****	PENDIENTE	€18 535 510,34
III-2-16	5-04-013	MEJORAMIENTO CAMINO LA GIGANTA - RIO CHIQUITO	€38 007 600,00	€0,00	€0,00	****	PENDIENTE	€38 007 600,00
III-2-19	5-04-046	MEJORAMIENTO CAMINO LOS ALVARADO	€32 005 493,90	€0,00	€0,00	****	PENDIENTE	€32 005 493,90
			<b>€642 329 715,36</b>	<b>€16 824 703,52</b>	<b>€445 153 381,64</b>			<b>€214 001 037,24</b>

En el gráfico adjunto se muestra el porcentaje de los proyectos viales de los distritos del cantón de Bagaces ejecutados durante año 2020 y lo que ingresaron a la lista de compromisos presupuestarios, según los fondos del ejercicio económico 2020.

**GRAFICO #2**

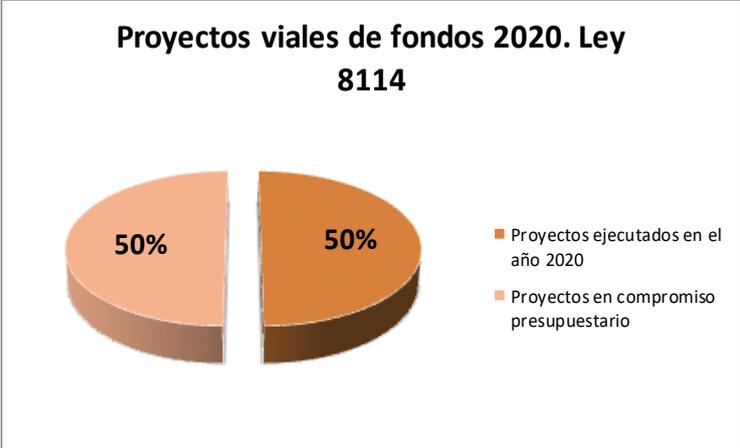

La tabla que se muestra a continuación refleja el estado de los proyectos del Presupuesto extraordinario 03-2020 al 31 de diciembre 2020. Los procesos de adjudicación para estos proyectos no fue posible iniciarlos debido a que el comunicado de aprobación de este presupuesto fue dado al cierre del mes de noviembre 2020, así como por los tiempos de cierre dados para recepción de trámites de requisiciones de compra establecidos mediante circular 021-2020 de la Alcaldía Municipal.

**TABLA #5**  
**ESTADO PROYECTOS DEL PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 03-2020 (POR SUPERAVIT 2019) AL CIERRE DEL AÑO 2020**

PRESUPUESTO EXTRAODINARIO 03-2020 (SUPERAVIT 2019). Ley 8114				
CODIGO PRESUPUESTARIO	PROYECTOS	MONTO ASIGNADO	MONTO ADJUDICADO	SALDO
III-2-20	Mejoramiento de cuestas Llanos del Cortes	¢44 586 637,15	¢0,00	¢44 586 637,15
III-2-21	Señalamiento vertical calles del cantón de Bagaces	¢14 819 754,54	¢0,00	¢14 819 754,54
		<b>¢59 406 391,69</b>		<b>¢59 406 391,69</b>

## **II.2 EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020. COMPARATIVA CON EL AÑO 2019.**

En las tablas detalladas a continuación se muestran los datos de la liquidación presupuestaria de acuerdo a las metas programadas, las alcanzadas y las no alcanzadas en el año 2020. Se expone de esta manera los trabajos programados, los ejecutados y los no ejecutados, así como sus montos. Para estos efectos, se indica la justificación con las razones del porque existen metas que no se realizaron en el año 2020 y que forman parte de los compromisos presupuestarios, que deben ejecutarse en los primeros seis meses del año 2021 de acuerdo a lo establecido en el Código Municipal.

Además se realiza una comparativa entre la liquidación presupuestaria del año 2019, en la cual se alcanzó un porcentaje de ejecución presupuestaria mayor al año 2020. Esto refleja que situaciones como la improbación inicial del Presupuesto Ordinario 2020 por parte de la Contraloría General de la República incidió en un retraso de tiempo, reflejado tanto en procesos de adjudicación como en ejecución de las metas programadas.

Las tablas mostradas a continuación muestran los datos de la liquidación presupuestaria de los años 2019 y 2020, a fin de realizar una comparación entre la ejecución presupuestaria alcanzada en ambos años.

## TABLA #6

### LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2019.

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA LEY 8114. AÑO 2019									
			Proyecto	INICIAL	MODIFICACIONES	SALDO	COMPROMISOS	EJECUCION	SALDO
III	02	1	Unidad técnica de gestión vial municipal	€ 276 395 324,35	-€ 24 205 901,29	€ 252 189 423,06	€ 4 213 853,00	€ 208 121 356,44	€ 39 854 213,62
III	02	2	Operativos	€ 580 079 984,21	-€ 108 141 433,69	€ 471 938 550,52	€ 133 715 867,40	€ 322 374 503,98	€ 15 848 179,14
III	02	3	Rehabilitación Camino Agua Caliente	€ 56 021 700,00	-€ 10 963 388,80	€ 45 058 311,20	€ -	€ 45 058 311,20	€ -
III	02	4	Rehabilitación camino Montano	€ 183 243 774,00	€ 4 385 215,93	€ 187 628 989,93	€ -	€ 187 628 989,93	€ -
III	02	5	Rehabilitación Camino Zanja del Barro	€ 171 734 526,00	-€ 21 935 666,33	€ 149 798 859,67	€ -	€ 149 798 859,67	€ -
III	02	6	Cunetas revestidas la Giganta	€ 50 000 000,00	€ 114 118,22	€ 50 114 118,22	€ -	€ 50 114 118,22	€ -
III	02	7	Construcción de vado sector Play Fortuna Centro	€ 5 000 000,00	-€ 150 000,00	€ 4 850 000,00	€ 4 850 000,00	€ -	€ -
III	02	8	Asfaltado Centro de Fortuna	€ 70 000 000,00	-€ 396 123,20	€ 69 603 876,80	€ 3 839 597,20	€ 65 764 279,60	€ -
III	02	9	Mejoramiento camino San Bernardo-La Quesera	€ 35 000 000,00	-€ 1 377 483,46	€ 33 622 516,54	€ -	€ 33 622 516,54	€ -
III	02	10	Mantenimiento camino 5-04-004. Sector Fortuna	€ 24 000 000,00	-€ 115 000,00	€ 23 885 000,00	€ 23 885 000,00	€ -	€ -
III	02	11	Mejoramiento calles sector plaza vieja de Guayabo.	€ 34 000 000,00	€ 42 361 365,84	€ 76 361 365,84	€ -	€ 76 361 365,17	€ 0,67
III	02	12	Colocación TSS Camino Pueblo Nuevo	€ 85 000 000,00	€ 52 083 359,60	€ 137 083 359,60	€ -	€ 137 083 359,60	€ -
III	02	13	Bacheo calles urbanas Guayabo	€ 35 000 000,00	-€ 610 000,00	€ 34 390 000,00	€ 34 390 000,00	€ -	€ -
III	02	14	Mejoramiento Camino Rincón de la Cruz	€ 36 000 000,00	€ 2 141 610,25	€ 38 141 610,25	€ -	€ 38 141 610,25	€ -
III	02	15	Mejoramiento calles Barrio 2000	€ 20 000 000,00	€ 14 774 153,37	€ 34 774 153,37	€ -	€ 34 774 153,33	€ 0,04
III	02	16	Mejoramiento calles urbanización Naranjito	€ 60 000 000,00	€ 25 332 327,65	€ 85 332 327,65	€ -	€ 85 332 327,64	€ 0,01
III	02	17	Mejoramiento camino Rio Chiquito	€ 60 000 000,00	€ 29 561 038,57	€ 89 561 038,57	€ -	€ 89 561 038,57	€ -
III	02	18	Construcción de cunetas camino la Giganta sector Rio Naranjo	€ 41 000 000,00	-€ 19 259 156,72	€ 21 740 843,28	€ -	€ 21 740 843,28	€ -
III	02	19	Rehabilitación de las cuestas de Limonal y San Isidro	€ 20 000 000,00	-€ 3 932 400,00	€ 16 067 600,00	€ -	€ 16 067 600,00	€ -
III	02	20	Estudio diseño alcantarillado Barrio Miravalles Guayabo	€ -	€ 10 000 000,00	€ 10 000 000,00	€ 8 000 000,00	€ -	€ 2 000 000,00
III	02	21	Reductores de velocidad canton Bagaces	€ -	€ 4 000 000,00	€ 4 000 000,00	€ -	€ 3 900 000,00	€ 100 000,00
III	02	22	Estudio técnico y diseño preliminar del puente de Rio Chiquito sector de la escuela 150 metros sur camino 5-04-043	€ -	€ 6 333 364,06	€ 6 333 364,06	€ 4 316 000,00	€ -	€ 2 017 364,06
III	02	23	Mejoramiento calles urbanas Guayabo	€ 3 425 040,00	€ -	€ 3 425 040,00	€ 3 425 040,00	€ -	€ -
<b>TOTAL</b>				<b>€ 1 845 900 348,56</b>	<b>-€ 0,00</b>	<b>€ 1 845 900 348,56</b>	<b>€ 2 20 635 357,60</b>	<b>€ 1 565 445 233,42</b>	<b>€ 59 819 757,54</b>

## TABLA #7

### LIQUIDACION PRESUPUESTARIA 2020.

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA LEY 8114. AÑO 2020									
			Proyecto	INICIAL	MODIFICACIONES	SALDO	COMPROMISOS	EJECUCION	SALDO
III	02	1	Unidad técnica de gestión vial municipal	€ 246 412 146,66	-€ 8 650 000,00	€ 237 762 146,66	€ 664 273,46	€ 194 175 938,16	€ 42 921 935,04
III	02	2	Operativos	€ 349 112 917,70	€ 12 650 000,00	€ 361 762 917,70	€ 57 015 138,98	€ 260 599 494,45	€ 44 148 284,27
III	02	3	Mejoramiento camino Montano hacia Cofradia	€ 68 574 871,64	€ -	€ 68 574 871,64	€ 53 574 352,00	€ 15 000 370,00	€ 149,64
III	02	4	Mantenimiento y Mejoramiento de calles urbanas Bagaces	€ 155 750 963,55	€ -	€ 155 750 963,55	€ -	€ 155 750 963,23	€ 0,32
III	02	5	Mejoramiento calle El Salto	€ 28 744 926,00	€ -	€ 28 744 926,00	€ -	€ 28 744 926,00	€ -
III	02	6	Mejoramiento camino Agua Caliente	€ 64 847 202,00	€ -	€ 64 847 202,00	€ -	€ 64 847 183,52	€ 18,48
III	02	7	Mejoramiento camino de entronque de ruta nacional 165 hacia San Bernardo	€ 78 091 021,68	€ -	€ 78 091 021,68	€ -	€ 78 091 021,68	€ -
III	02	8	Mejoramiento camino Cúpilapa-La Giganta	€ 36 078 881,00	€ -	€ 36 078 881,00	€ 36 078 881,00	€ -	€ -
III	02	9	Mejoramiento camino de entronque Poza Peña hacia Cúpilapa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
III	02	10	Mejoramiento camino Pueblo Nuevo	€ 70 837 395,90	€ -	€ 70 837 395,90	€ -	€ 70 837 391,90	€ 4,00
III	02	11	Mejoramiento y mantenimiento calles urbanas Guayabo	€ 31 881 520,99	€ -	€ 31 881 520,99	€ -	€ 31 881 520,99	€ -
III	02	12	Mejoramiento caminos Limonal-San Isidro	€ 35 799 200,00	€ -	€ 35 799 200,00	€ 35 799 200,00	€ -	€ -
III	02	13	Estudios técnicos preliminares calles de Barrio Miravalles	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
III	02	14	Estudios técnicos preliminares estructura para paso sobre Quebrada en Río Chiquito	€ 4 000 000,00	-€ 4 000 000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
III	02	15	Mejoramiento calles Sector Este	€ 18 535 510,34	€ -	€ 18 535 510,34	€ 18 535 510,34	€ -	€ -
III	02	16	Mejoramiento camino La Giganta-Río Chiquito	€ 38 007 600,00	€ -	€ 38 007 600,00	€ 38 007 600,00	€ -	€ -
III	02	17	Mejoramiento camino Río Chiquito	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
III	02	18	Mejoramiento cunetas Naranjito	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
III	02	19	Mejoramiento camino Los Alvarado	€ 32 005 493,90	€ -	€ 32 005 493,90	€ 32 005 493,90	€ -	€ -
III	02	20	Mejoramiento de cuestas Llanos del Cortés	€ 44 586 637,15	€ -	€ 44 586 637,15	€ -	€ -	€ 44 586 637,15
III	02	21	Señalamiento vertical calles del cantón de Bagaces	€ 14 819 754,54	€ -	€ 14 819 754,54	€ -	€ -	€ 14 819 754,54
			<b>TOTAL</b>	<b>€ 1 318 086 043,05</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1 318 086 043,05</b>	<b>€ 271 680 449,68</b>	<b>€ 899 928 809,93</b>	<b>€ 146 476 783,44</b>

(\*) Los proyectos III-2-9, III-2-13, III-2-14, III-2-17, III-2-18, no se ejecutaron debido al rebajo del Presupuesto Ordinario 2020, por Decreto Legislativo N°9879 publicado en la Gaceta N°186 del 29 de julio 2020 y acuerdo número #042 de Sesión Ordinaria 08-2020 de la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Bagaces (Anexo 1).

Los gráficos presentados a continuación muestran los porcentajes de ejecución alcanzados durante los años 2019 y 2020, reflejando también el porcentaje que formó parte de los compromisos presupuestarios en ambos períodos.

**TABLA #8**

COMPARATIVA ENTRE EL AÑO 2019 Y EL 2020		
DETALLE	2019	2020
PRESUPUESTO ASIGNADO	₡ 1 845 900 348,56	₡ 1 318 086 043,05
MONTO CANCELADO	₡ 1 565 445 233,42	₡ 899 928 809,93
COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS	₡ 220 635 357,60	₡ 271 680 449,68
TOTAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	₡ 1 786 080 591,02	₡ 1 171 609 259,61
SALDO	₡ 59 819 757,54	₡ 146 476 783,44


**GRÁFICO #3**




**GRÁFICO #4**



**GRÁFICO #5**

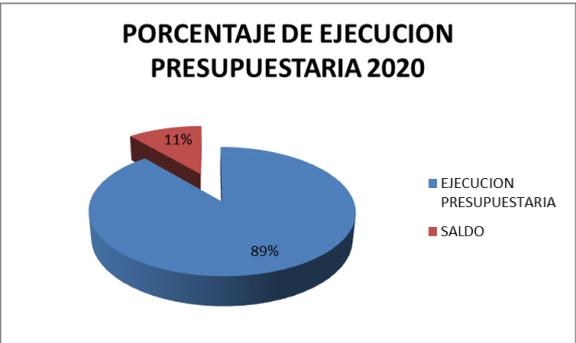

**GRÁFICO #6**

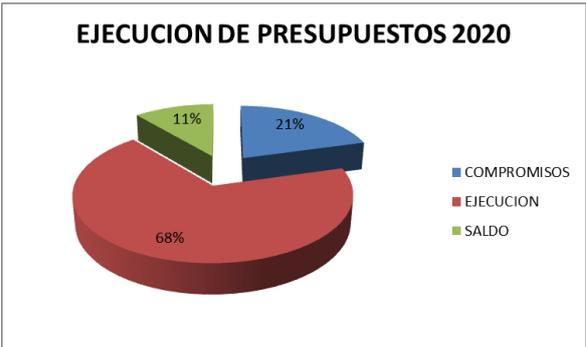

La siguiente tabla muestra la justificación con las razones de aquellas metas no alcanzadas en el año 2020 y que forman parte de los compromisos presupuestarios.

**TABLA #9**

**JUSTIFICACION DE COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS 2020.**

COMPROMISOS PRESUPUESTARIOS UTGVM 2020 (A EJECUTAR ANTES DEL 30 DE JUNIO 2021)						
N° de proceso	N° Orden Compra	Fecha Orden de Compra	Monto en compromiso	Proveedor	Detalle	Justificación
2020LA-05-P02	32662	10/9/2020	₡ 48 749 630,00	Concreteira Guanacasteca y Liberia S.A	Mejoramiento camino Montano hacia Cofradía	Una vez realizado el depósito del cuarto tracto en la fecha 22-setiembre-2020 por parte del Ministerio de Hacienda se procedió a dar orden de inicio a los proyectos Mejoramiento camino Agua Caliente (Bagaces), Mejoramiento de entronque ruta nacional 165 camino a San Bernardo (Fortuna), Mejoramiento camino Pueblo Nuevo (Guayabo), Mejoramiento y mantenimiento calles urbanas Guayabo (Guayabo) por un monto superior a los ₡ 233.000.000,00 de colones, lo cual nos dejó sin contenido económico para poder dar orden de inicio a otro proyecto, lo que nos obligó a esperar que se realizara el quinto desembolso por parte del Ministerio de Hacienda para poder abrir los proyectos pendientes. En fecha 25-noviembre-2020 se realiza por parte del Ministerio de Hacienda el depósito del quinto desembolso, hasta esta fecha nos pueden realizar la firma de las órdenes de compra, notificación de las órdenes de compra y realizar órdenes de inicio. Se consulta a las empresas la disponibilidad de equipo para iniciar los trabajos lo antes posible, dando como resultado que la única que tiene disponibilidad inmediata es Concreteira Guanacasteca y Liberia S.A adjudicada del Mejoramiento camino Montano hacia Cofradía por lo que se da orden de inicio para este proyecto, en fecha 27-11-2020, sin embargo entre el inicio de los trabajos y el cierre de recepción de facturas según la circular 021-2020 de la Alcaldía, no fue posible concluir en su totalidad el proyecto. (visible en el oficio MB-UTGV-0479-2020 enviado por el Ing. Ing-Fabricio Murillo Solano, Coordinador a.i. UTGV a la Alcaldía Municipal).
2020LA-05-P02	32791	17/12/2020	₡ 4 824 722,00	Concreteira Guanacasteca y Liberia S.A	Mejoramiento camino Montano hacia Cofradía (ampliación)	Una vez realizado el depósito del cuarto tracto en la fecha 22-setiembre-2020 por parte del Ministerio de Hacienda se procedió a dar orden de inicio a los proyectos Mejoramiento camino Agua Caliente (Bagaces), Mejoramiento de entronque ruta nacional 165 camino a San Bernardo (Fortuna), Mejoramiento camino Pueblo Nuevo (Guayabo), Mejoramiento y mantenimiento calles urbanas Guayabo (Guayabo) por un monto superior a los ₡ 233.000.000,00 de colones, lo cual nos dejó sin contenido económico para poder dar orden de inicio a otro proyecto, lo que nos obligó a esperar que se realizara el quinto desembolso por parte del Ministerio de Hacienda para poder abrir los proyectos pendientes. En fecha 25-noviembre-2020 se realiza por parte del Ministerio de Hacienda el depósito del quinto desembolso, hasta esta fecha nos pueden realizar la firma de las órdenes de compra, notificación de las órdenes de compra y realizar órdenes de inicio. Se consulta a las empresas la disponibilidad de equipo para iniciar los trabajos lo antes posible, dando como resultado que la única que tiene disponibilidad inmediata es Concreteira Guanacasteca y Liberia S.A adjudicada del Mejoramiento camino Montano hacia Cofradía por lo que se da orden de inicio para este proyecto, en fecha 27-11-2020, sin embargo entre el inicio de los

						trabajos y el cierre de recepción de facturas según la circular 021-2020 de la Alcaldía, no fue posible concluir en su totalidad el proyecto. (visible en el oficio MB-UTGV-0479-2020 enviado por el Ing. Ing. Fabricio Murillo Solano, Coordinador a.i. UTGV a la Alcaldía Municipal).
2020LA-05-P02	32663	10/9/2020	₡ 35 799 200,00	Concreteira Guanacasteca y Liberia S.A	Mejoramiento camino Limonal-San Isidro	Una vez realizado el depósito del cuarto tracto en la fecha 22-setiembre-2020 por parte del Ministerio de Hacienda se procedió a dar orden de inicio a los proyectos Mejoramiento camino Agua Caliente (Bagaces), Mejoramiento de entronque ruta nacional 165 camino a San Bernardo (Fortuna), Mejoramiento camino Pueblo Nuevo (Guayabo), Mejoramiento y mantenimiento calles urbanas Guayabo (Guayabo) por un monto superior a los ₡ 233.000.000,00 de colones, lo cual nos dejó sin contenido económico para poder dar orden de inicio a otro proyecto, lo que nos obligó a esperar que se realizara el quinto desembolso por parte del Ministerio de Hacienda para poder abrir los proyectos pendientes. En fecha 25-noviembre-2020 se realiza por parte del Ministerio de Hacienda el depósito del quinto desembolso, hasta esta fecha nos pueden realizar la firma de las órdenes de compra, notificación de las órdenes de compra y realizar órdenes de inicio. Se consulta a las empresas la disponibilidad de equipo para iniciar los trabajos lo antes posible, dando como resultado que la única que tiene disponibilidad inmediata es Concreteira Guanacasteca y Liberia S.A adjudicada del Mejoramiento camino Montano hacia Cofradía por lo que se da orden de inicio para este proyecto, además Concreteira Guanacasteca y Liberia S.A, es la adjudicada también del proyecto Mejoramiento camino Limonal- San Isidro y solo tienen el equipo para conformar un frente de trabajo. Estas razones no hicieron posible dar orden de inicio a este proyecto durante el año 2020. (visible en el oficio MB-UTGV-0479-2020 enviado por el Ing. Ing. Fabricio Murillo Solano, Coordinador a.i. UTGV a la Alcaldía Municipal).
2020LA-06-P02	32668	10/9/2020	₡ 18 535 510,34	Constructora Arhmer S.A	Mejoramiento calles Sector Este	La empresa adjudicada para este proyecto fue Constructora ARMHER S.A.De igual forma se consulta a la empresa acerca de la disponibilidad de equipo y maquinaria dando como resultado que entre el inicio de los trabajos en la ubicaciones requeridas y el cierre de recepción de facturas según la circular 021-2020 de la Alcaldía, únicamente podrían laborar 5 días este año, además los trabajos a realizar son construcción de cuneta de concreto como primer actividad y la zona a intervenir (Río Naranjo) en esta época es todavía muy lluviosa, por lo tanto se acuerda con la empresa ejecutar los trabajos en los primeros meses del próximo año esperando la transición a la época seca y los trabajos no se vean afectados por las inclemencias del tiempo. (visible en el oficio MB-UTGV-0479-2020 enviado por el Ing. Ing. Fabricio Murillo Solano, Coordinador a.i. UTGV a la Alcaldía Municipal).
2020LA-06-P02	32669	10/9/2020	₡ 32 005 493,90	Constructora Arhmer S.A	Mejoramiento camino Los Alvarado	También la empresa adjudicada para este proyecto fue Constructora ARMHER S.A. De igual forma se consulta a la empresa acerca de la disponibilidad de equipo y maquinaria dando como resultado que entre el inicio de los trabajos en la ubicaciones requeridas y el cierre de recepción de facturas según la circular 021-2020 de la Alcaldía, únicamente podrían laborar 5 días este año, además los trabajos a realizar son construcción de cuneta de concreto como primer actividad y la zona a intervenir (Río Naranjo) en esta época es todavía muy lluviosa, por lo tanto se acuerda con la empresa ejecutar los trabajos en los primeros meses del próximo año esperando la transición a la época seca y los trabajos no se vean afectados por las inclemencias del tiempo. (visible en el oficio MB-UTGV-0479-2020 enviado por el Ing. Ing. Fabricio Murillo Solano, Coordinador a.i. UTGV a la Alcaldía Municipal).
2020LA-06-P02	32670	10/9/2020	₡ 36 078 881,00	Asfaltos Laboro S.A	Mejoramiento camino Cuiupilapa-La Giganta	Este proyecto fue adjudicado a la empresa Asfaltos Laboro S.A. Se consulta a la empresa acerca de la disponibilidad de equipo y maquinaria dando como resultado que entre el inicio de los trabajos en la ubicaciones requeridas y el cierre de recepción de facturas según la circular 021-2020 de la Alcaldía, únicamente podrían laborar 4 días este año, además los trabajos a realizar son de colocación de concreto y la zona a intervenir (La Giganta) en esta época es

						<p>todavía muy lluviosa, por lo tanto se acuerda con la empresa ejecutar los trabajos en los primeros meses del próximo año esperando la transición a la época seca y los trabajos no se vean afectados por las inclemencias del tiempo.(visible en el oficio MB-UTGV-0479-2020 enviado por el Ing. Ing. Fabricio Murillo Solano, Coordinador a.i. UTGV a la Alcaldía Municipal).</p>
2020LA-06-P02	32671	10/9/2020	₡ 38 007 600,00	Asfaltos Laboro S.A	Mejoramiento camino La Giganta-Río Chiquito	<p>Este proyecto de igual forma fue adjudicado a la empresa Asfaltos Laboro S.A. Se consulta a la empresa acerca de la disponibilidad de equipo y maquinaria dando como resultado que entre el inicio de los trabajos en la ubicaciones requeridas y el cierre de recepción de facturas según la circular 021-2020 de la Alcaldía, únicamente podrían laborar 4 días este año, además los trabajos a realizar son de colocación de concreto y la zona a intervenir (La Giganta) en esta época es todavía muy lluviosa, por lo tanto se acuerda con la empresa ejecutar los trabajos en los primeros meses del próximo año esperando la transición a la época seca y los trabajos no se vean afectados por las inclemencias del tiempo. (visible en el oficio MB-UTGV-0479-2020 enviado por el Ing. Ing. Fabricio Murillo Solano, Coordinador a.i. UTGV a la Alcaldía Municipal).</p>
2020CD-07-P01	32572	15/4/2020	₡ 280,00	Lemen de Costa Rica	MATERIALES DE LIMPIEZA	<p>La empresa adjudicada en esta contratación no hizo entrega de los insumos adjudicados antes del cierre de recepción de facturas según la circular 021-2020 de la Alcaldía Municipal, razón por la cual no fue posible realizar la cancelación en el año 2020.</p>
2020CD-17-P01	32589	13/5/2020	₡ 5 850 000,00	Asfaltos Laboro S.A	MEZCLA/ EMULSION	<p>En fecha 26-11-2020 se da orden de inicio a esta contratación, sin embargo entre el inicio de los trabajos y el cierre de recepción de facturas según la circular 021-2020 de la Alcaldía, no fue posible concluiría en su totalidad.</p>
2020CD-20-P01	32598	27/5/2020	₡ 5 980 247,19	Consortio de Información y Seguridad S.A	SEGURIDAD PLANTEL UTGVM	<p>El saldo de esta orden de compra se debe a que dicho servicio fue contratado por 9 meses y se dio orden de inicio a partir del 28 de mayo 2020, razón por lo cual el resto del periodo contratado debe ser ejecutado en el siguiente año.</p>
2020CD-43-P01	32661	9/9/2020	₡ 3 781 538,88	Consortio de Información y Seguridad S.A	SEGURIDAD GALERON VERTEDERO	<p>El saldo de esta orden de compra se debe a que dicho servicio fue contratado por 4 meses y se dio orden de inicio a partir del 18 de setiembre 2020, razón por lo cual el resto del periodo contratado debe ser ejecutado en el siguiente año.</p>
2020CD-49-P01	32721	2/11/2020	₡ 144 223,02	Datamax S.A	TINTAS	<p>La empresa adjudicada en esta contratación no hizo entrega de los insumos adjudicados antes del cierre de recepción de facturas según la circular 021-2020 de la Alcaldía Municipal, razón por la cual no fue posible realizar la cancelación en el año 2020.</p>
2020CD-55-P01	32740	20/11/2020	₡ 102 116,06	Almacenes El Colono S.A	HERRAMIENTAS	<p>La notificación de la factura de esta contratación no fue realizada antes del cierre de recepción de facturas según la circular 021-2020 de la Alcaldía Municipal, razón por la cual no fue posible realizar la cancelación en el año 2020.</p>
2020CD-55-P01	32743	20/11/2020	₡ 158 726,00	Comercial El Bagaceño CB S.A	HERRAMIENTAS	<p>la notificación de la factura de esta contratación no fue realizada antes del cierre de recepción de facturas según la circular 021-2020 de la Alcaldía Municipal, razón por la cual no fue posible realizar la cancelación en el año 2020.</p>
2020CD-55-P01	32745	20/11/2020	₡ 174 555,00	Deposito de maderas El Unico de Bagaces S.A	HERRAMIENTAS	<p>la notificación de la factura de esta contratación no fue realizada antes del cierre de recepción de facturas según la circular 021-2020 de la Alcaldía Municipal, razón por la cual no fue posible realizar la cancelación en el año 2020.</p>
2020CD-61-P01	32751	4/12/2020	₡ 3 000 150,00	Servicentro Bagaces S.A	COMBUSTIBLE	<p>El consumo de este insumo no se realizó en su totalidad durante el año 2020. Además la notificación de facturas de lo consumido no se realizó antes del cierre de recepción de facturas según la circular 021-2020 de la Alcaldía Municipal, razón por la cual no fue posible realizar la cancelación en el año 2020.</p>

2020CD-64-P01	32768	7/12/2020	₡ 2 095 580,30	Maquinaria y Tractores Limitada	REPUESTOS Y REP. DE NIVELADORA Y COMPACTADORA	La notificación de esta orden de compra fue realizada el 14-12-202 por lo que no se pudo girar orden de inicio ya que no era posible realizar la cancelación antes del cierre de recepción de facturas según la circular 021-2020 de la Alcaldía Municipal
2020CD-64-P01	32769	7/12/2020	₡ 4 471 426,60	Maquinaria y Tractores Limitada	REPUESTOS Y REP. DE NIVELADORA Y COMPACTADORA	La notificación de esta orden de compra fue realizada el 14-12-202 por lo que no se pudo girar orden de inicio ya que no era posible realizar la cancelación antes del cierre de recepción de facturas según la circular 021-2020 de la Alcaldía Municipal
2020CD-64-P01	32770	7/12/2020	₡ 380 000,00	Maquinaria y Tractores Limitada	REPUESTOS Y REP. DE NIVELADORA Y COMPACTADORA	La notificación de esta orden de compra fue realizada el 14-12-202 por lo que no se pudo girar orden de inicio ya que no era posible realizar la cancelación antes del cierre de recepción de facturas según la circular 021-2020 de la Alcaldía Municipal
2020CD-59-P01	32778	7/12/2020	₡ 285 000,00	JCAS de Palmares SCN S.A	RELOJ MARCADOR	La entrega de este reloj marcador por parte de la empresa adjudicada se realizó en fecha posterior al cierre de recepción de facturas según la circular 021-2020 de la Alcaldía Municipal, razón por la cual no fue posible cancelarla en el año 2020.
2020CD-66-P01	32799	22/12/2020	₡ 370 000,00	Farmagro S.A	SIERRA TELESCOPICA	La empresa adjudicada en esta contratación no hizo entrega de los insumos adjudicados antes del cierre de recepción de facturas según la circular 021-2020 de la Alcaldía Municipal, razón por la cual no fue posible realizar la cancelación en el año 2020.
2020CD-67-P01	32800	22/12/2020	₡ 715 163,21	Almacenes El Colono S.A	MATERIALES DE CONSTRUCCION	La empresa adjudicada en esta contratación no hizo entrega de los insumos adjudicados antes del cierre de recepción de facturas según la circular 021-2020 de la Alcaldía Municipal, razón por la cual no fue posible realizar la cancelación en el año 2020.
2018CD-000052-P01	32038	OPERATIVOS	₡ 5 695 338,16	Partes de Camion S.A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Esta orden de compra no fue cancelada en su totalidad ya que al ser un mantenimiento preventivo se cancelan parcialmente de acuerdo a las horas maquinaria utilizadas.
2018CD-000015-P01	31945	OPERATIVOS	₡ 2 005 780,77	Maquinaria y Tractores Limitada	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Esta orden de compra no fue cancelada en su totalidad ya que al ser un mantenimiento preventivo se cancelan parcialmente de acuerdo a las horas maquinaria utilizadas.
2018LA-000007-P02	32142	OPERATIVOS	₡ 19 000 000,00	DECSA Costa Rica S.A	SISTEMA INTEGRADO	Esta cancelación no fue posible realizarla debido a que los diferentes módulos de este programa debían cancelarse hasta puesta en marcha la producción del sistema. Por lo tanto dicha cancelación podrá ser realizada una vez que la implementación y uso del mismo haya sido aceptado por la Municipalidad.

2019CD-000026-P01	32314	UNIDAD TECNICA	₡ 920,00	12	Teleservicios Digitales JBM S.A	DIFERENCIAL CAMBIARIO	Fue un compromiso presupuestario generado debido a la diferencia en el monto de la compra realizada en dólares por diferencial cambiario del tipo de cambio del dólar.
2019CD-000050-P01	32393	OPERATIVOS	₡ 2 602 500,00		Constructora Arhmer S.A	TANQUE DE AGUA	Cuando esta orden de compra estaba disponible para orden de inicio al cierre del año 2020, la condiciones climáticas de lluvia no permitieron la utilización de este tanque de agua.
CONVE-ICE	32478	OPERATIVOS	₡ 867,25	733	Instituto Costarricense de Electricidad	SALDO CONVENIO	Dado que este servicio se realizó mediante un convenio con el ICE, la instalación de la acometida eléctrica tuvo un costo menor a lo estipulado inicialmente en la orden de compra; generando dicho saldo.
			₡ 271 680 449,68				

(\*) Anexo 2: oficio MB-UTGV-0479-2020 enviado por el Ing. Fabricio Murillo Solano, Coordinador a.i. UTGV a la Alcaldía Municipal.

### II.3 INFORMACION TECNICA DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2020.

La tabla presentada a continuación muestra las obras realizadas en obras por contrato durante el año 2020. En esta información se contemplan tanto las obras que se llevaron a cabo antes del 30 de junio 2020 por compromisos presupuestarios como los proyectos realizados con los fondos del ejercicio económico 2020.

**TABLA #10**  
**INTERVENCIONES REALIZADAS EN OBRA POR CONTRATO 2020**

PROYECTO	CODIGO	DISTRITO	TIPO DE INTERVENCIÓN	DISTANCIA INTERVENIDA M	MONTO DE INVERSIÓN
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CALLES URBANAS GUAYABO	5-04-022	GUAYABO	Señalización horizontal	5110	€3 425 040,00
BACHEO CALLES URBANAS GUAYABO	5-04-022	GUAYABO	Colocación de carpeta asfáltica y bacheo	790	€34 390 000,00
ESTUDIO TÉCNICO Y DISEÑO PRELIMINAR DEL PUENTE DE RIO CHIQUITO SECTOR DE LA ESCUELA 150 METROS SUR CAMINO 5-04-043	5-04-043	RÍO NARANJO	Estudios técnicos	NO APLICA	€4 316 000,00
ESTUDIO DISEÑO ALCANTARILLADO BARRIO MIRAVALLLES GUAYABO	5-04-022	GUAYABO	Estudios técnicos	NO APLICA	€8 000 000,00
CONSTRUCCIÓN DE VADO SECTOR PLAY FORTUNA CENTRO	5-04-021	FORTUNA	Construcción de vado de concreto	NO APLICA	€4 850 000,00
SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL CENTRO FORTUNA	5-04-021	FORTUNA	Señalización horizontal	3000	€3 839 597,20
MANTENIMIENTO CAMINO 5-04-004 SECTOR FORTUNA	5-04-004	FORTUNA	Limpieza de cunetas, bacheo y cunetas revestidas	3200	€23 885 000,00
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS BAGACES	5-04-020	BAGACES	Colocación de carpeta asfáltica y bacheo	2500	€155 750 963,55
MEJORAMIENTO CALLE EL SALTO	5-04-026	BAGACES	Colocación de carpeta asfáltica Construcción de Barandas	520	€28 744 926,00
MEJORAMIENTO CAMINO AGUA CALIENTE	5-04-015	BAGACES	Conformación de la superficie de ruedo Colocación de material base Colocación de tratamiento superficial bituminoso	2300	€64 847 183,52
MEJORAMIENTO CAMINO DE ENTRONQUE DE RUTA NACIONAL 165 HACIA SAN BERNARDO	5-04-003	FORTUNA	Colocación de carpeta asfáltica	1770	€78 091 021,68
MEJORAMIENTO CAMINO PUEBLO NUEVO	5-04-007	GUAYABO	Colocación de carpeta asfáltica	1907	€70 837 395,90
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CALLES URBANAS GUAYABO	5-04-022	GUAYABO	Colocación de carpeta asfáltica y bacheo	1000	€31 881 520,99
MEJORAMIENTO CAMINO MONTANO HACIA COFRADIA	5-04-001	BAGACES	Conformación de la superficie de ruedo Colocación de base Colocación de tratamiento superficial Bituminoso	300	€15 000 370,00
				22,397 KM	€527 859 018,84

Seguidamente se realiza una descripción de las obras realizadas por contrato durante el año 2020. En la cual se indican las actividades llevadas a cabo, el monto de la inversión y una referencia fotográfica.

**PROYECTO:** Señalización horizontal Calles Urbanas Guayabo.

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-022

**DISTRITO:** Guayabo

**LICITACIÓN ABREVIADA No.:** 2018LA-000004-P02

**OBRAS EJECUTADAS:** Señalización Horizontal.

**SITIO DE INTERVENCIÓN:** Costado este del Redondel, sector de Plaza Vieja.

**LONGITUD APROXIMADA DE INTERVENCIÓN:** 5110m

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ¢ 3.425.040,00

**FOTOS DEL PROYECTO:**



**PROYECTO:** Mejoramiento y mantenimiento Calles Urbanas Guayabo.

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-022

**DISTRITO:** Guayabo

**LICITACIÓN ABREVIADA No.:** 2019LA-000004-P02

**OBRAS EJECUTADAS:** Colocación de 362 toneladas de mezcla asfáltica en carpeta y bacheo menor.

**SITIO DE INTERVENCIÓN:** Costado este del Redondel, sector de Plaza Vieja, sector El Colegio.

**LONGITUD APROXIMADA DE INTERVENCIÓN:** 790m

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ¢ 34.390.000,00

**FOTOS DEL PROYECTO:**



**PROYECTO:** Estudios preliminares Río Chiquito.

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-043

**DISTRITO:** Río Naranjo

**CONTRATACIÓN DIRECTA No.:** 2019CD-000068-P01

**OBRAS EJECUTADAS:** Estudio hidrológicos, hidráulicos y de suelos para determinar la estructura a construir sobre Río Chiquito.

**SITIO DE INTERVENCIÓN:** 145 metro oeste de la escuela pública de Río Chiquito.

**LONGITUD APROXIMADA DE INTERVENCIÓN:** No aplica

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡ 4.316.000,00

**FOTOS DEL PROYECTO:**



DJU ASESORIAS

GÁVEA  
INGENIERÍA

Fecha: Enero, 2020  
No. Informe: INF-19-115a  
Cliente: Municipalidad de Bagaces, Guanacaste



Gávea Ingeniería S.A.  
San José, Barrio Luján, Calle 13, Av. 12-14, No. 1269, 10104.  
Tel: +506 8449-170 Fax: +506 2221-5996  
Info@gaveaingenieria.com www.gaveaingenieria-cr.com

**PROYECTO:** Estudios preliminares, anteproyecto y diseños para construcción del sistema de alcantarillado Barrio Miravalles.

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-022

**DISTRITO:** Guayabo

**CONTRATACIÓN DIRECTA No.:** 2019CD-000068-P01

**OBRAS EJECUTADAS:** Estudios preliminares, anteproyecto y diseños para construcción del sistema de alcantarillado.

**SITIO DE INTERVENCIÓN:** Barrio Miravalles, Guayabo.

**LONGITUD APROXIMADA DE INTERVENCIÓN:** No aplica.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡ 8.000.000,00

**FOTOS DEL PROYECTO:**



DJU ASESORIAS

GÁVEA  
INGENIERÍA

Fecha: Febrero, 2020  
No. Informe: INF-19-115b  
Cliente: Municipalidad de Bagaces, Guanacaste



**PROYECTO:** Construcción de vado sector Play de Fortuna.

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-021

**DISTRITO:** Fortuna

**LICITACIÓN ABREVIADA No.:** 2019LA-000004-P02

**OBRAS EJECUTADAS:** Construcción de vado de concreto estructural

**SITIO DE INTERVENCIÓN:** Diagonal a Play de Fortuna.

**LONGITUD APROXIMADA DE INTERVENCIÓN:** No aplica

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡ 4.850.000,00

**FOTOS DEL PROYECTO:**



**PROYECTO:** Señalización Horizontal Cuadrantes de Fortuna.

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-021

**DISTRITO:** Fortuna

**LICITACIÓN ABREVIADA No.:** 2019LA-000004-P02

**OBRAS EJECUTADAS:** Señalización horizontal.

**SITIO DE INTERVENCIÓN:** Cuadrantes de Fortuna.

**LONGITUD APROXIMADA DE INTERVENCIÓN:** 3000m

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡ 3.839.597,20

**FOTOS DEL PROYECTO:**



**PROYECTO:** Mantenimiento Camino 5-04-004 Sector Fortuna.

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-004

**DISTRITO:** Fortuna

**LICITACIÓN ABREVIADA No.:** 2019LA-000004-P02

**OBRAS EJECUTADAS:** Limpieza mecanizada de cunetas, bacheo menor y construcción de cunetas revestidas.

**SITIO DE INTERVENCIÓN:** De la estación 0+850 a la estación 4+150.

**LONGITUD APROXIMADA DE INTERVENCIÓN:** 3200m

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ¢ 23.885.000,00

**FOTOS DEL PROYECTO:**



**PROYECTO:** Mejoramiento Calles Urbanas Bagaces

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-020

**DISTRITO:** Bagaces

**LICITACIÓN ABREVIADA No.:** 2020LA-000003-P02


**OBRAS EJECUTADAS:** Colocación de 2400 toneladas de mezcla asfáltica en carpeta, bacheo menor y señalización horizontal.

**SITIO DE INTERVENCIÓN:** Av.8 Cementerio, Calle 1 del Colegio norte, Av. 5 del Gimnasio al Colono, Calle central del Renur al norte, Calle 2 costado oeste del Redondel, Av.4 costado sur de escuela GTG, Calle 4 al sur de La Musmani, Av 6 de C1 a C3, Av.8 costado sur del BCR, Av.7 de C2 a C4, De licorera El Zorro al Este, 100N del BCR al este y 100S del BCR al este.

**LONGITUD APROXIMADA DE INTERVENCIÓN:** 2500m

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡155.750.963,55

**FOTOS DEL PROYECTO:**

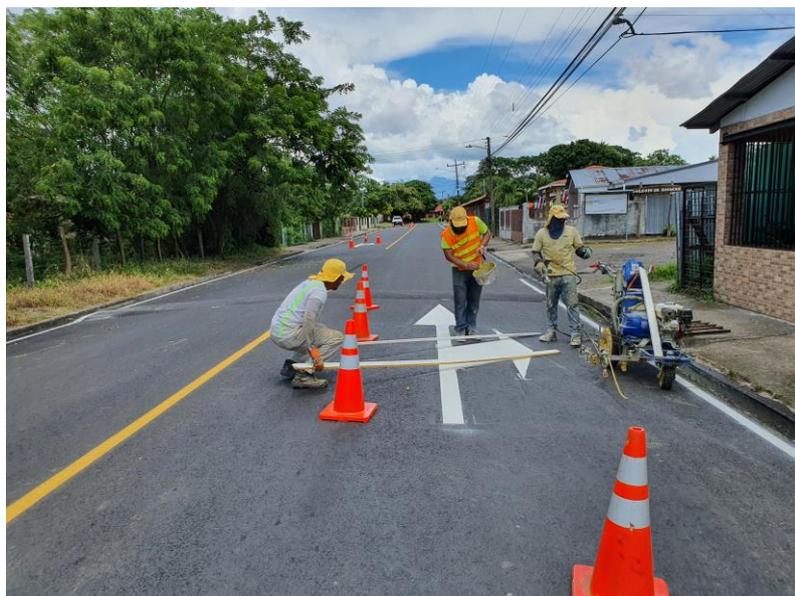

**PROYECTO:** Mejoramiento Calle El Salto

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-026

**DISTRITO:** Bagaces

**LICITACIÓN ABREVIADA No.:** 2020LA-000003-P02


**OBRAS EJECUTADAS:** Colocación de 400 toneladas de mezcla asfáltica en carpeta y colocación de baranda flex beam.

**SITIO DE INTERVENCIÓN:** Del entronque con la Ruta Nacional 1 a la esquina noreste de la plaza de deportes de la comunidad.

**LONGITUD APROXIMADA DE INTERVENCIÓN:** 520m

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡ 28.744.926,00

**FOTOS DEL PROYECTO:**

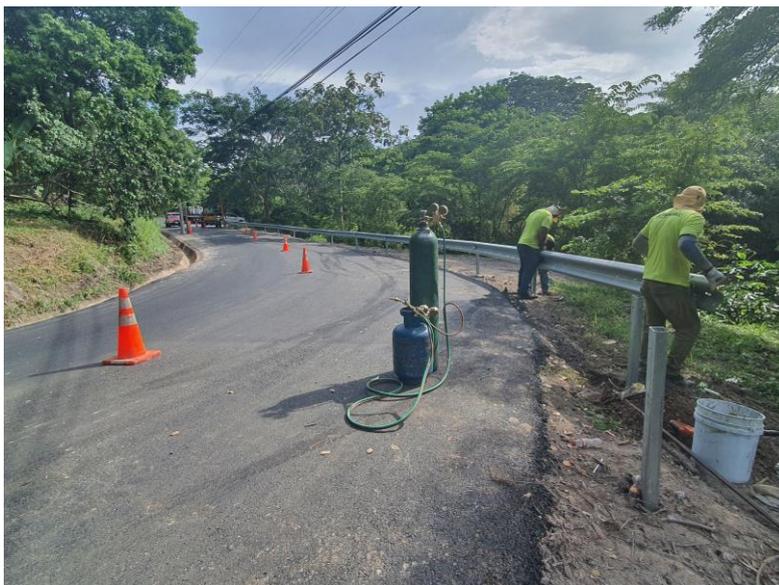

**PROYECTO:** Mejoramiento Camino Aguacaliente

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-015

**DISTRITO:** Bagaces

**LICITACIÓN ABREVIADA No.:** 2020LA-000004-P02

**OBRAS EJECUTADAS:** Reacondicionamiento de la superficie de ruedo, colocación de base granular y tratamiento superficial bituminoso.

**SITIO DE INTERVENCIÓN:** Del entronque con la Ruta Cantonal 5-04-019 al Asentamiento INDER Aguacaliente.

**LONGITUD APROXIMADA DE INTERVENCIÓN:** 2300m

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡ 64.847.183,52

**FOTOS DEL PROYECTO:**



**PROYECTO:** Mejoramiento camino del entronque del Ruta Nacional 165 hacia San Bernardo.

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-003

**DISTRITO:** Fortuna

**LICITACIÓN ABREVIADA No.:** 2020LA-000004-P02

**OBRAS EJECUTADAS:** Colocación de 1176 toneladas de mezcla asfáltica en carpeta.

**SITIO DE INTERVENCIÓN:** Del entronque con la Ruta Nacional 165 a la plaza de deportes de San Bernardo

**LONGITUD APROXIMADA DE INTERVENCIÓN:** 1770m

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡ 78.091.021,68

**FOTOS DEL PROYECTO:**



**PROYECTO:** Mejoramiento camino Pueblo Nuevo.

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-007

**DISTRITO:** Guayabo

**LICITACIÓN ABREVIADA No.:** 2020LA-000005-P02

**OBRAS EJECUTADAS:** Colocación de 1177 toneladas de mezcla asfáltica en carpeta.

**SITIO DE INTERVENCIÓN:** Del entronque con la Ruta Nacional 164 hasta la estación 1+907.

**LONGITUD APROXIMADA DE INTERVENCIÓN:** 1907m

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ¢ 70.837.395,90

**FOTOS DEL PROYECTO:**



**PROYECTO:** Mejoramiento y mantenimiento Calles Urbanas Guayabo.

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-022

**DISTRITO:** Guayabo

**LICITACIÓN ABREVIADA No.:** 2020LA-000004-P02

**OBRAS EJECUTADAS:** Colocación de 467 toneladas de mezcla asfáltica en carpeta y bacheo menor.

**SITIO DE INTERVENCIÓN:** Cuadrante de la Escuela Pública, costado este del Redondel, Calle El Colegio y alrededores de Plaza Vieja.

**LONGITUD APROXIMADA DE INTERVENCIÓN:** 1000m

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡ 31.881.520,99

**FOTOS DEL PROYECTO:**



**PROYECTO:** Mejoramiento Camino Montano hacia Cofradía. (Proyecto aún en Ejecución)

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-001

**DISTRITO:** Bagaces

**LICITACIÓN ABREVIADA No.:** 2020LA-000005-P02

**OBRAS EJECUTADAS:** Reacondicionamiento de la superficie de ruedo, colocación de base granular y tratamiento superficial bituminoso.

**SITIO DE INTERVENCIÓN:** De la Escuela Pública estación 6+107 hasta la estación 6+367.

**LONGITUD APROXIMADA DE INTERVENCIÓN:** 300m (Obras aún en ejecución).

**MONTO DE LA INVERSIÓN (A LA FECHA):** ₡ 15.000.370,00

**FOTOS DEL PROYECTO:**



En la siguiente tabla se detallan aquellas obras realizadas durante el año 2020 por medio de la modalidad de administración, es decir, aquellas en las cuales se utilizó maquinaria y personal municipal; así como materiales de construcción e insumos adquiridos mediante el proyecto Operativos III-2-2

**TABLA # 11**  
**INTERVENCIONES REALIZADAS POR ADMINISTRACIÓN 2020**

NOMBRE	CODIGO	DISTRITO	TIPO DE INTERVENCIÓN	DISTANCIA INTERVENIDA KM	MONTO DE INVERSIÓN
HUAQUITAS	5-04-010 5-04-041	BAGACES BAGACES	Limpieza, conformación y colocación de base granular	1,748 0,496	₺ 8 110 000,00
CAMINO LA SIERRA	5-04-139	BAGACES	Limpieza, conformación y colocación de base granular	1,100	₺ 6 791 120,00
CAMIO RIO PERDIDO A RIO BLANCO	5-04-050	FORTUNA	Limpieza, conformación y colocación de base granular	1,000	₺ 3 352 000,00
CAMINO LAS CASUELAS	5-04-027	BAGACES	Limpieza, conformación y colocación de base granular	1,500	₺ 1 047 000,00
CAMINO SALITRAL HACIA SAN ISIDRO	5-04-032	BAGACES	Limpieza, conformación y colocación de base granular	3,600	₺ 4 796 500,00
CAMINO DE FALCONIANA	5-04-098	BAGACES	Limpieza, conformación y colocación de base granular	1,500	₺ 9 222 450,00
CALLES URBANAS BAGACES Y URBANIZACIÓN PEDRO NOLAZCO	5-04-020 5-04-094	BAGACES BAGACES	Bacheo menor	15,000	₺ 9 448 000,00
FALCONIANA	5-04-098	BAGACES	Limpieza, conformación y colocación de base granular	0,900	₺ 8 770 820,00
BAGATZI	5-04-030	BAGACES	Limpieza, conformación y colocación de base granular	2,400	₺ 16 126 630,00
MONTANO/RIO BLANCO	5-04-054	BAGACES	Limpieza, conformación y colocación de base granular	1,500	₺ 14 511 795,00
ARBOLITO/CALLE IVANIA	5-04-121	BAGACES	Limpieza, conformación y colocación de base granular	0,150	₺ 1 516 000,00
CHILE /ESCUELA-CUSUCA /2020	5-04-086	BAGACES	Limpieza, conformación y colocación de base granular	0,300	₺ 1 608 000,00
CALLE RIO BRASIL	5-04-053	BAGACES	Limpieza, conformación y colocación de base granular	0,500	₺ 3 420 000,00
CALLE RIO BRASIL	5-04-027	BAGACES	Limpieza, conformación y colocación de base granular	1,000	
LLANOS DEL CORTES	5-04-065	GUAYABO	Limpieza, conformación colocación de alcantarillas y base granular	2,600	₺ 8 370 000,00
RINCON DE LACRUZ	5-04-024	GUAYABO	Limpieza, conformación y colocación de base granular	2,200	₺ 4 912 000,00
SAN JORGE-GAETANO	5-04-040	GUAYABO	Limpieza, conformación colocación de alcantarillas y base granular	2,500	₺ 14 804 337,50
SAN JORGE CEMENTERIO	5-04-037	GUAYABO	Limpieza, conformación colocación de alcantarillas y base granular	2,000	₺ 15 094 632,00
PUEBLO NUEVO	5-04-008	GUAYABO	Limpieza, conformación y colocación de base granular	0,250	₺ 2 358 137,00
BARRIO LOS ANGELES	5-04-073	GUAYABO	Limpieza, conformación y colocación de base granular	1,757	₺ 10 522 760,00
SALITRAL (PUENTE )	5-04-032	BAGACES	Limpieza, conformación y colocación de base granular	0,100	₺ 3 140 400,00
PUENTE QUEMADO	5-04-015	BAGACES	Limpieza, conformación y colocación de base granular	0,200	₺ 1 384 000,00
PUEBLO NUEVO (ALCANTARILLADO)	5-04-007	GUAYABO	Colocación de alcantarillas		₺ 3 710 000,00
SAN/B. C FRENTE ENTRADA RIO PERDIDO	5-04-081	FORTUNA	Limpieza, conformación colocación de alcantarillas y base granular	1,480	₺ 17 216 632,20
CALLE BRINDIS	5-04-126	FORTUNA	Limpieza, conformación y colocación de base granular	0,230	₺ 1 938 299,20
CALLE CEMENTERIO S/B	5-04-080	FORTUNA	Limpieza, conformación y colocación de base granular	0,525	₺ 5 024 046,00
CALLE ZUÑIGA	5-04-106	FORTUNA	Limpieza, conformación colocación de alcantarillas y base granular	0,460	₺ 2 801 812,00
PARCELAS RIO BLANCO FORTUNA	5-04-091	FORTUNA	Limpieza, conformación y colocación de base granular	0,210	₺ 716 600,00
CUIPILAPA	5-04-013	FORTUNA	Limpieza, conformación y colocación de base granular	0,700	₺ 1 510 000,00
CALLE GALERA	5-04-166	BAGACES	Limpieza, conformación y colocación de base granular	0,145	₺ 740 000,00
FORTUNA CENTRO	5-04-021	FORTUNA	Limpieza, conformación colocación de alcantarillas y base granular	0,600	₺ 7 352 000,00
			Total:	48,201 KM	₺ 190 315 970,90

Seguidamente se realiza una descripción de las obras realizadas por administración durante el año 2020. En la cual se indican las actividades llevadas a cabo, el monto de la inversión y una referencia fotográfica.

**CAMINO:** Huaquitas

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-010, 5-04-041

**DISTRITO:** Bagaces

**OBRAS EJECUTADAS:** Limpieza, conformación y colocación de base granular.

**LONGITUD DE INTERVENCIÓN:** 2244m.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡ 8 110 000,00

**FOTO DE LA INTERVENCIÓN:**



**CAMINO:** La Sierra

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-139

**DISTRITO:** Bagaces

**OBRAS EJECUTADAS:** Limpieza, conformación y colocación de base granular.

**LONGITUD DE INTERVENCIÓN:** 1100m.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡ 6.791.120,00

**FOTO DE LA INTERVENCIÓN:**



**CAMINO:** Río Perdido (Mico Pintado)

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-050

**DISTRITO:** Fortuna

**OBRAS EJECUTADAS:** Limpieza, conformación y colocación de base granular.

**LONGITUD DE INTERVENCIÓN:** 1000m.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ¢ 3.352.000,00

**FOTO DE LA INTERVENCIÓN:**



**CAMINO:** Las Cazuelas

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-027

**DISTRITO:** Bagaces

**OBRAS EJECUTADAS:** Limpieza, conformación y colocación de base granular.

**LONGITUD DE INTERVENCIÓN:** 1500m.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡ 1.047.000,00

**FOTO DE LA INTERVENCIÓN:**



**CAMINO:** Falconiana

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-098

**DISTRITO:** Bagaces

**OBRAS EJECUTADAS:** Limpieza, conformación y colocación de base granular.

**LONGITUD DE INTERVENCIÓN:** 2600m.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡ 18 218 820,00

**FOTO DE LA INTERVENCIÓN:**



**CAMINO:** Cuadrantes Urbanos Bagaces y Urbanización Pedro Nolasco

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-020, 5-04-094

**DISTRITO:** Bagaces

**OBRAS EJECUTADAS:** Bacheo menor.

**LONGITUD DE INTERVENCIÓN:** 16000m.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡ 9.448.000,00

**FOTO DE LA INTERVENCIÓN:**



**CAMINO:** Bagatzí

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-030

**DISTRITO:** Bagaces

**OBRAS EJECUTADAS:** Limpieza, conformación y colocación de base granular.

**LONGITUD DE INTERVENCIÓN:** 2400m.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡ 16.126.630,00

**FOTO DE LA INTERVENCIÓN:**



**CAMINO:** Montano-Río Blanco

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-054

**DISTRITO:** Bagaces

**OBRAS EJECUTADAS:** Limpieza, conformación y colocación de base granular.

**LONGITUD DE INTERVENCIÓN:** 1500m.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡ 14.511.795,00

**FOTO DE LA INTERVENCIÓN:**



**CAMINO:** Calle Los Castro (Ivania)

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-121

**DISTRITO:** Bagaces

**OBRAS EJECUTADAS:** Limpieza, conformación y colocación de base granular.

**LONGITUD DE INTERVENCIÓN:** 150m.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡ 1.516.000,00

**FOTO DE LA INTERVENCIÓN:**



**CAMINO:** Calle La Cusuca

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-086

**DISTRITO:** Bagaces

**OBRAS EJECUTADAS:** Limpieza, conformación y colocación de base granular.

**LONGITUD DE INTERVENCIÓN:** 300m.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡ 1.608.000,00

**FOTO DE LA INTERVENCIÓN:**



**CAMINO:** Calle Río Brasil

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-027, 5-04-053

**DISTRITO:** Bagaces

**OBRAS EJECUTADAS:** Limpieza, conformación y colocación de base granular.

**LONGITUD DE INTERVENCIÓN:** 1500m.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡ 3.420.000,00

**FOTO DE LA INTERVENCIÓN:**



**CAMINO:** Cuadrantes Llanos de Cortés

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-065

**DISTRITO:** Bagaces

**OBRAS EJECUTADAS:** Limpieza, conformación y colocación de base granular.

**LONGITUD DE INTERVENCIÓN:** 2600m.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡ 8.370.000,00

**FOTO DE LA INTERVENCIÓN:**



**CAMINO:** San Jorge Colonia Blanca

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-040

**DISTRITO:** Guayabo

**OBRAS EJECUTADAS:** Limpieza, conformación y colocación de base granular.

**LONGITUD DE INTERVENCIÓN:** 2500m.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ¢ 14.804.337,50

**FOTO DE LA INTERVENCIÓN:**



**CAMINO:** San Jorge Cementerio

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-037

**DISTRITO:** Guayabo

**OBRAS EJECUTADAS:** Limpieza, conformación, colocación de alcantarillas y base granular.

**LONGITUD DE INTERVENCIÓN:** 2000m.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡ 15.094.632,00

**FOTO DE LA INTERVENCIÓN:**



**CAMINO:** Pueblo Nuevo

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-008

**DISTRITO:** Guayabo

**OBRAS EJECUTADAS:** Limpieza, conformación y colocación de base granular.

**LONGITUD DE INTERVENCIÓN:** 250m.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ¢ 2.358.137,00

**FOTO DE LA INTERVENCIÓN:**



**CAMINO:** Barrio Los Ángeles

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-073

**DISTRITO:** Guayabo

**OBRAS EJECUTADAS:** Limpieza, conformación y colocación de base granular.

**LONGITUD DE INTERVENCIÓN:** 1757m.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡ 10.522.760,00

**FOTO DE LA INTERVENCIÓN:**



**CAMINO:** Pueblo Nuevo

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-007

**DISTRITO:** Guayabo

**OBRAS EJECUTADAS:** Colocación de alcantarillas.

**LONGITUD DE INTERVENCIÓN:** 50m.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ¢ 1.384.000,00

**FOTO DE LA INTERVENCIÓN:**



**CAMINO:** Frente a entrada a Río Perdido

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-081

**DISTRITO:** Fortuna

**OBRAS EJECUTADAS:** Limpieza, conformación, colocación de alcantarillas y base granular.

**LONGITUD DE INTERVENCIÓN:** 1480m.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ¢ 17.216.632,00

**FOTO DE LA INTERVENCIÓN:**



**CAMINO:** Calle Cementerio de San Bernardo

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-080

**DISTRITO:** Fortuna

**OBRAS EJECUTADAS:** Limpieza, conformación y colocación de base granular.

**LONGITUD DE INTERVENCIÓN:** 525m.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ¢ 5.024.046,20

**FOTO DE LA INTERVENCIÓN:**



**CAMINO:** Calle Zúñiga

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-106

**DISTRITO:** Fortuna

**OBRAS EJECUTADAS:** Limpieza, conformación, colocación de tubería y base granular.

**LONGITUD DE INTERVENCIÓN:** 460m.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡ 2.801.812,00

**FOTO DE LA INTERVENCIÓN:**



**CAMINO:** La Giganta (Las Tilapias Cuipilapa)

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-013

**DISTRITO:** Fortuna

**OBRAS EJECUTADAS:** Limpieza, conformación y colocación de base granular.

**LONGITUD DE INTERVENCIÓN:** 700m.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ¢ 1.510.000,00

**FOTO DE LA INTERVENCIÓN:**



**CAMINO:** La Tribu (Los Galera)

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-166


**DISTRITO:** Bagaces

**OBRAS EJECUTADAS:** Limpieza, conformación y colocación de base granular.

**LONGITUD DE INTERVENCIÓN:** 145m.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡ 740.000,00

**FOTO DE LA INTERVENCIÓN:**

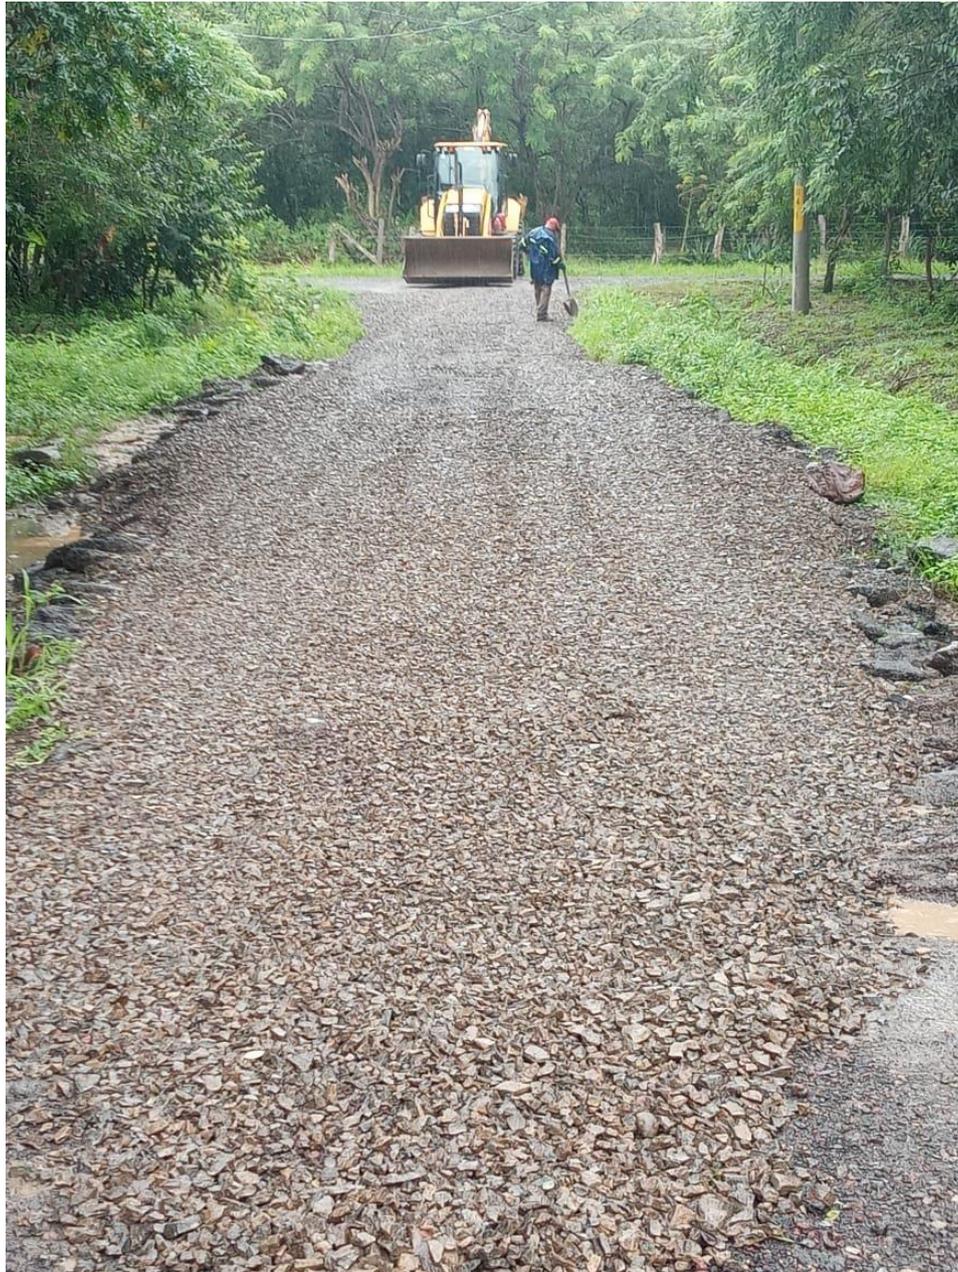

**CAMINO:** Cuadrantes Urbanos Fortuna

**CÓDIGO DE CAMINO:** 5-04-021

**DISTRITO:** Fortuna

**OBRAS EJECUTADAS:** Limpieza, conformación, colocación de alcantarillas y base granular.

**LONGITUD DE INTERVENCIÓN:** 600 m.

**MONTO DE LA INVERSIÓN:** ₡ 7.352.000,00

**FOTO DE LA INTERVENCIÓN:**



## CAPITULO III. PROMOCION SOCIAL.

### **PRINCIPALES ACCIONES COORDINADAS DESDE LA PROMOCIÓN SOCIAL**

#### Socialización del presupuesto 2021

Se realiza visita a cada uno de los distritos del cantón para validar la propuesta de los proyectos que se van a ejecutar con el presupuesto de la ley 8114 correspondiente al año 2021, en la cual participan ASODES, concejos de distritos y organizaciones comunales de cada uno de los distritos se abordaron las principales necesidades de intervención en caminos para ser tomados en cuenta en el presupuesto, a raíz de estos procesos de socialización de presupuesto surgieron los principales proyectos a realizar en el año 2021.

El mismo se desarrolla de manera presencial en el distrito de Fortuna y Rio Naranjo, los distritos Guayabo y Bagaces se realizaron en coordinación con los Concejos de Distrito respectivos; esto a razón de la pandemia que enfrenta nuestro país.



## ATENCIÓN DE IMPACTOS HURACAN ETA Y IOTA

Si bien es cierto nuestro cantón no sufrió impacto directo del Huracán ETA y IOTA, la red vial de nuestro cantón si sufrió afectaciones indirectas siendo necesario realizar evaluación de daños para gestionar un primer impacto con la habilitación de 2 fuentes para extracción de material y la adquisición de horas pala excavadora para la extracción del material y limpieza de cauces que se encuentran sedimentados por las altas crecidas de los ríos (estamos a la espera de la aprobación respectiva). Anteriormente a estos eventos se ha tenido que atender afectaciones por las precipitaciones que han afectado a nuestro cantón en apoyo de la CNE con horas máquina de la pala excavadora a través de un primer impacto.

Como primera respuesta para la habilitación de diferentes caminos afectados por estas tormentas la intervención fue realizada con maquinaria municipal con una inversión de \$37.000.000 millones los cuales contemplan horas máquina, horas hombre, lastre y alcantarillas las principales actividades realizadas:

- ✓ Habilitación de la superficie de ruedo
- ✓ Mejoramiento en los sistemas de drenaje

<b>CAMINOS ATENDIDOS</b>
SAN JORGE
SAN BERNARDO
LA SOGA
LLANOS DEL CORTES
ARBOLITO
SALITRAL/VADO/ CAMINO BRASIL
LLANOS DEL CORTES
COFRADIA
CAZUELAS
CEMENTERIO/GUAYABO
PUEBLO NUEVO
SAN PEDRO





## LANZAMIENTO MICROEMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL POR ESTANDARES.

Nuestro cantón es parte de los 21 cantones a nivel nacional que están incursionando en la consolidación de una microempresa que permita realizar labores de mantenimiento manual en 45 km de la red vial dicho programa es financiado por el programa MOPT BID y nuestra municipalidad con una inversión de \$338.347.654,00

Este proyecto se estará realizando en los siguientes caminos

- ✓ 5-04-001 San Antonio Montano
- ✓ 5-04-061 Montano corralillo
- ✓ 5-04-003 Santa Fe San Bernardo
- ✓ 5-04-004 Fortuna Guayabo
- ✓ 5-04-013 Cuipilapa Rio Chiquito

Principales acciones desarrolladas para poner en marcha la Microempresa

- ✓ Coordinación para firma convenio Municipalidad MOPT
- ✓ Proceso de coordinación y Selección de la Asociación de desarrollo que estará administrando la Microempresa; participantes Asodes Fortuna, Asodes Bagaces y Asodes San Bernardo; organización seleccionada ASODES FORTUNA
- ✓ coordinación y selección de trabajadores de la microempresa (12)
- ✓ coordinación y selección administrador de la microempresa (1)

- ✓ Elaboración de informes en cada una de las fase I, II,III
- ✓ Coordinación finiquito formalización del contrato entre ASODES Fortuna y MOPT
- ✓ Coordinación orden de inicio de la Microempresa (inicio 18 de enero 2021)





## **Anexos.**

**1. Acuerdo número #042 de Sesión Ordinaria 08-2020**

**2. Oficio MB-UTGV-0479-2020 enviado por el Ing.  
Fabricio Murillo Solano, Coordinador a.i. UTGV a la  
Alcaldía Municipal.**
